

MICROSOFT PROJECT

IDÍLICA DECO LIDER EN FORMACIÓN DE DISEÑO DE INTERIORES

Microsoft Project:

- Microsoft Project es un software de **administración de proyectos**, que permite la asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al avance, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.
- Con Microsoft Project resulta fácil crear y modificar tareas, **permite visualizar los cambios de manera inmediata** y **mantener informados del avance del proyecto a la organización.**

Consideraciones importantes

- Definir el objetivo y tareas que se deberán cumplir para alcanzar ese objetivo.
- Identificar a los responsables y fechas de cumplimiento de cada actividad, además de materiales y costos en el desarrollo del proyecto.



Inicio

Proyecto1 - Project Profesional

ArchivoTareaRecursoInformeProyectoVistaAyudaDiagrama de GanttFormato¿Qué desea hacer?

Diagrama de GanttVer

PegarPortapapeles

Calibri11NKS Fuente

0%25%50%75%100%Actualizar según programaciónRespetar vínculosDesactivarProgramación

Programar manualmenteAutoprogramarTareas

TareaInsertar

InformaciónPropiedades

Desplazarse a tareaEdición

Inicio

jue 6/2/25

Agregar tareas con fechas a la línea de tiempo

Fin

jue 6/2/25

Diagrama de Gantt

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	X	J	V	S	2 feb '25	D	L	M	X	J	V	S	9 feb '25	D	L	M	X	J	V	S	16 feb '25	D	L	M	X	J	V	S	23 feb '25	D	L	M	X	J	V	S
TABLA DE ENTRADA							GRAFICO DE GANTT																																			

IDILICA

DISEÑO DE INTERIORES

Listo

Nuevas tareas : Programada automáticamente

Información del proyecto 'Proyecto1' ×

Fin
jue 6/2/25

×

Fecha actual: jue 6/2/25

Fecha de estado: NOD

Calendario: Estándar


<u>P</u> rioridad:	500
--------------------	-----

Departamento:

Nombre de campo personalizado	Valor

Cancelar

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

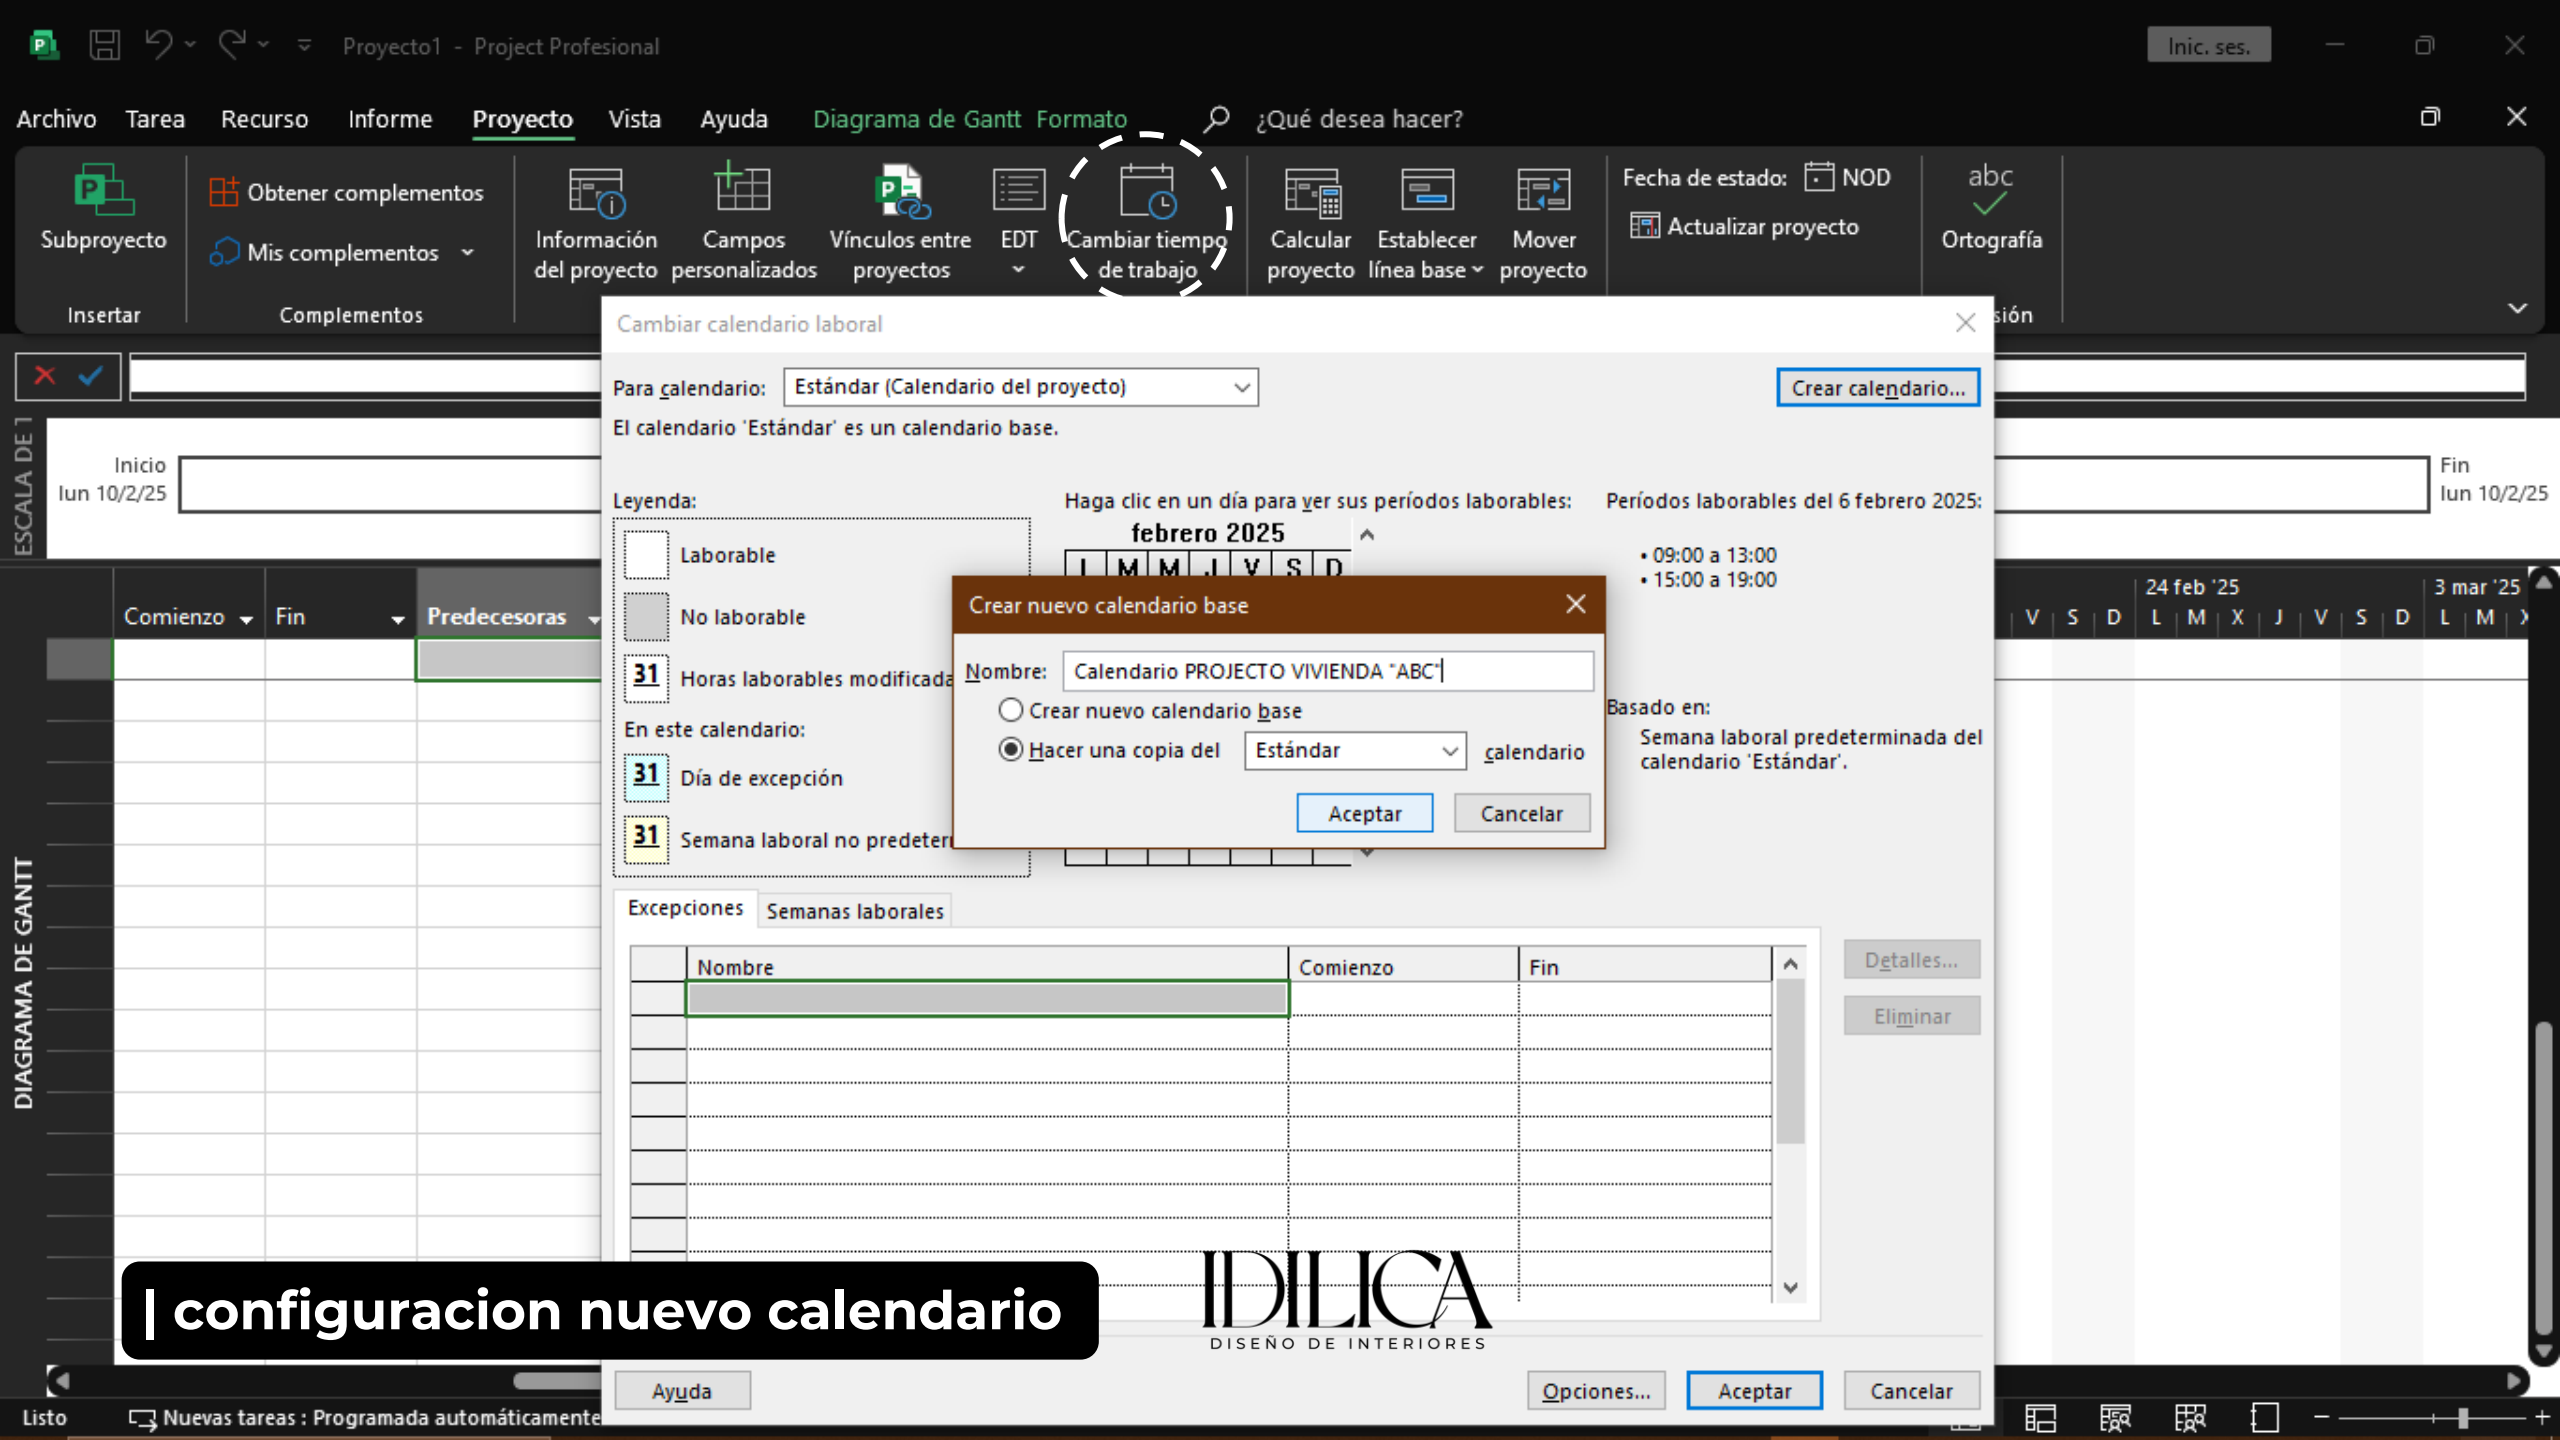

| configuracion nuevo calendario

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

Cambie el modo en que se muestra el contenido de Project en la pantalla.

Calendario

Tipo de calendario: Calendario Gregoriano

Opciones de moneda para este proyecto:  Proyecto1 ▾

Símbolo: \$

Dígitos decimales: 2

Ubicación: \$ 1

Moneda: ARS

Mostrar indicadores y botones de opciones de:

- ✓ Asignaciones de recursos
- ✓ Modificaciones de fechas de comienzo y finalización
- ✓ Modificaciones del trabajo, las unidades o la duración
- ✓ Eliminaciones en las columnas de nombre

Mostrar estos elementos:

- ☒ Barra de entrada
- ☒ Estado de conexión junto al nombre

| configuracion area de trabajo

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

Aceptar

Cancelar

ESCALA DE

Inicio

lun 10/2/25

Agregar tareas con fechas a la línea de tiempo

Fin

lun 10/2/25

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES


| configuracion area de trabajo



Inserta una nueva tarea encima de la tarea seleccionada.

Las nuevas tareas se programan según la configuración del Modo de programación.


IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES



Inserta una tarea que se produce regularmente durante el transcurso del proyecto.

Por ejemplo, puede definir una reunión de estado semanal como una tarea recurrente.

| **agregar tarea periódica**



17 feb '25							24 feb '25							3 mar '25		
L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

Diagrama de Gantt

Ver

Pegar

Portapapeles

Calibri 11

N K S A

Fuente

0% 25% 50% 75% 100%

Actualizar según programación

Respetar vínculos

Desactivar

Programación

Programar manualmente

Autoprogramar

Tareas

Tarea

Insertar

Información

Propiedades

Desplazarse a tarea

Edición

Tarea 01

Inserta una tarea de resumen

Inserta una tarea de resumen para ayudar a organizar la lista de tareas.

Si se seleccionan algunas tareas, se agruparán bajo la nueva tarea de resumen creada.

| configuracion tareas y subtareas





Crear una jerarquía le ayudará a organizar mejor sus tareas.

DIAGRAMA DE GANTT

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

Diagrama de Gantt

Ver

Pegar

Portapapeles

Calibri 11

N K S A

Fuente

0% 25% 50% 75% 100%

Actualizar según programación

Respetar vínculos

Desactivar

Programación

Programar manualmente

Autoprogramar

Tareas

Tarea

Insertar

Información

Propiedades

Desplazarse a tarea

Edición

<Tarea nueva>

Aplica sangría a la tarea (Alt+Mayús+Derecha)
Esta tarea se vuelve una subtarea.
Crear una jerarquía le ayudará a organizar mejor sus tareas.

DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	3 feb '25							10 feb '25							17 feb '25							24 feb '25							3 mar '25																
						L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D		L	M	X	J	V	S	D					
1			ETAPA 01	4 días	lun 10/2/25								jue 13/2/25																																				
2			Tarea 01	3 días	lun 10/2/25								mié 12/2/25																																				
3			Tarea 02	4 días	lun 10/2/25								jue 13/2/25																																				
4			Tarea 03	2 días	lun 10/2/25								mar 11/2/25																																				
5			Tarea 04	2 días	lun 10/2/25								mar 11/2/25																																				
6			Reuniones semanales	20 días?	lun 10/2/25								vie 7/3/25																																				
7			Reuniones semanales 1	1 día	vie 14/2/25								vie 14/2/25																																				
8			Reuniones semanales 2	1 día	vie 21/2/25								vie 21/2/25																																				
9			Reuniones semanales 3	1 día	vie 28/2/25								vie 28/2/25																																				
10			Reuniones semanales 4	1 día	vie 7/3/25								vie 7/3/25																																				
11			ETAPA 02	1 día?	lun 10/2/25								lun 10/2/25																																				
12			<Tarea nueva>	1 día?	lun 10/2/25								lun 10/2/25																																				

| configuracion tareas y subtareas



Estilos de texto

Cuadrícula

Diseño

Insertar columna

Configuración de columnas

Campos personalizados

Formato

Tareas críticas

Demora

Tareas retrasadas

Ruta de acceso a la tarea

Línea base

Atraso

Estilo de diagrama de Gantt


Número de esquema





Tarea de resumen del proyecto

Tareas de resumen

Dibujos

Tarea de resumen del proyecto
Muestra la tarea de resumen para el proyecto.

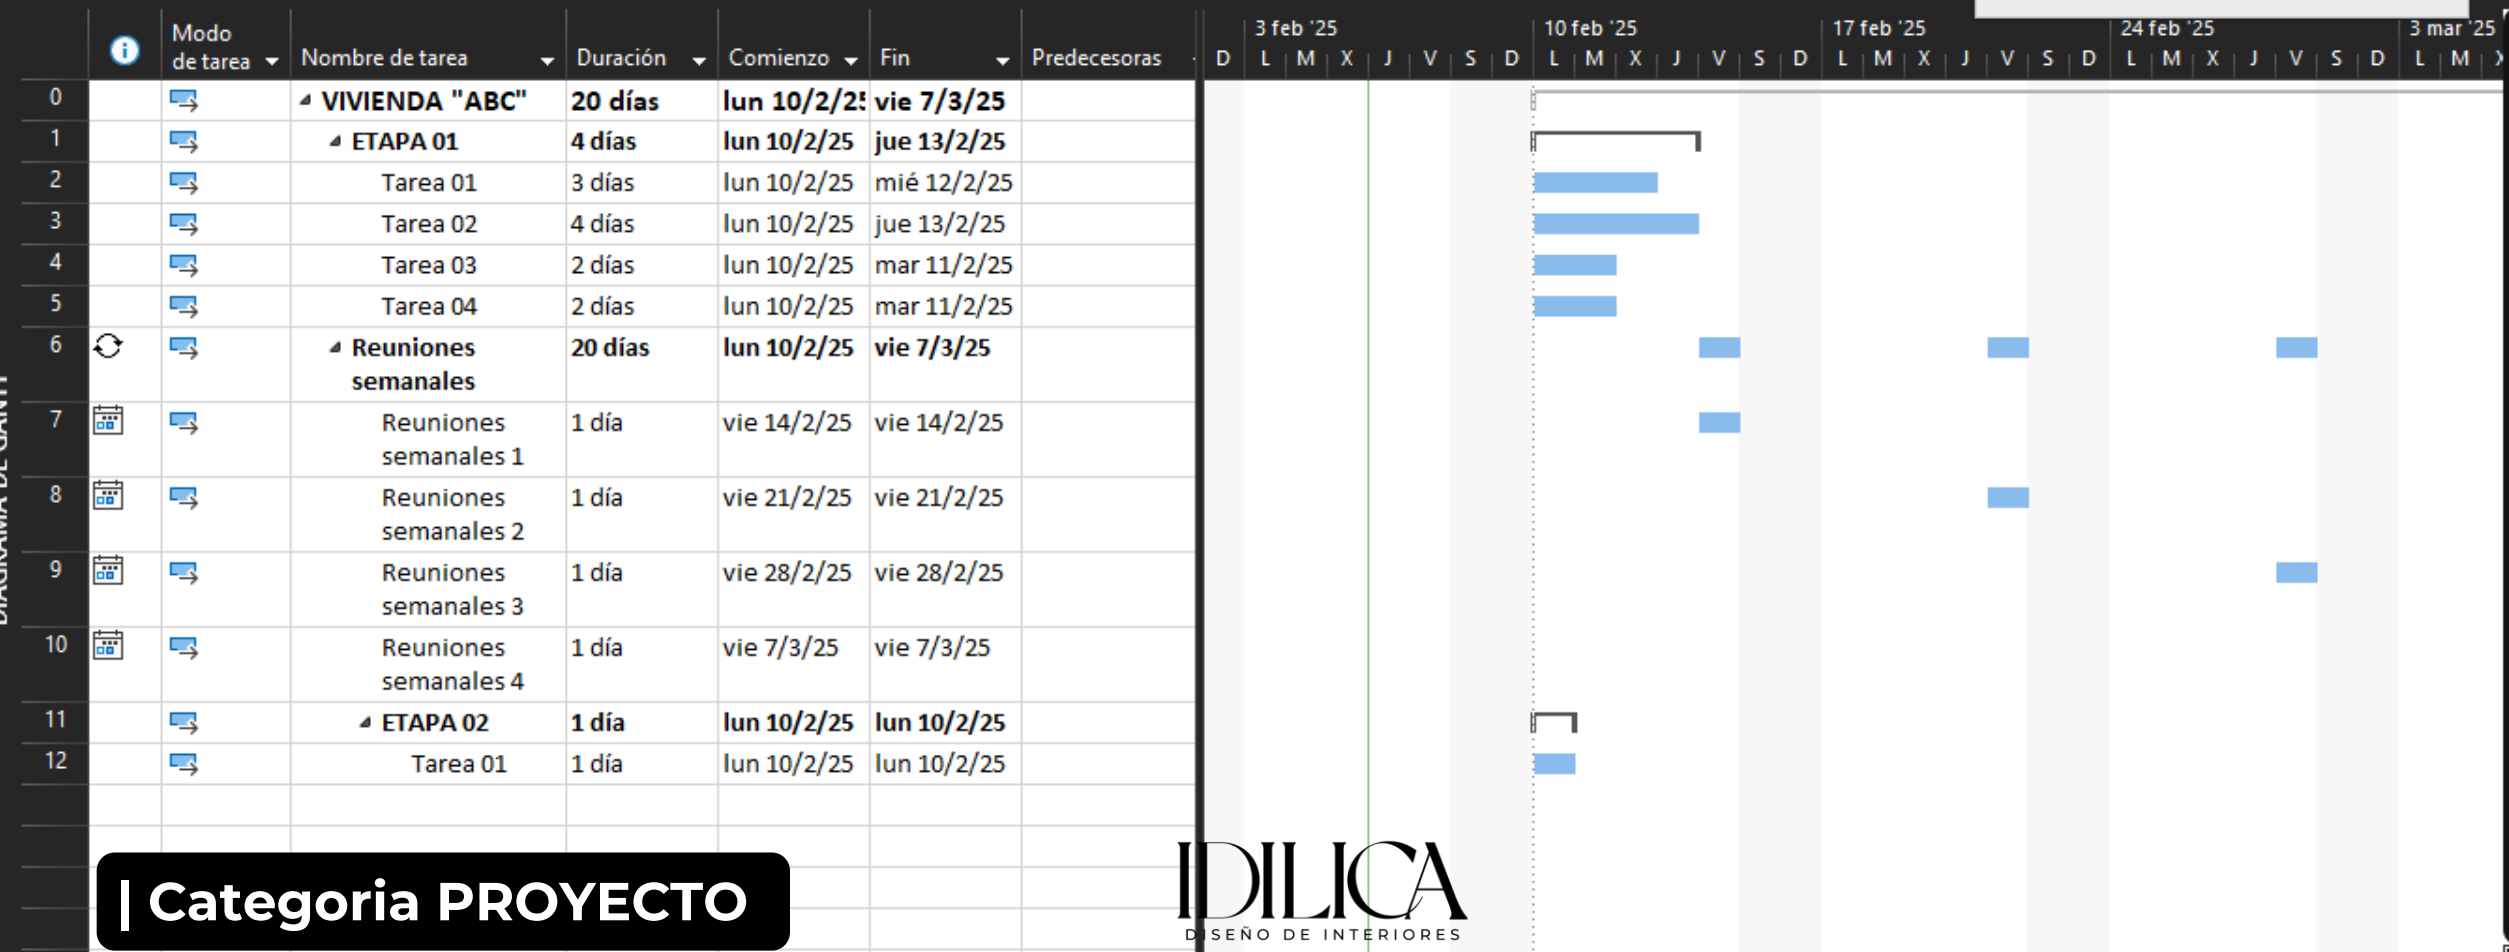

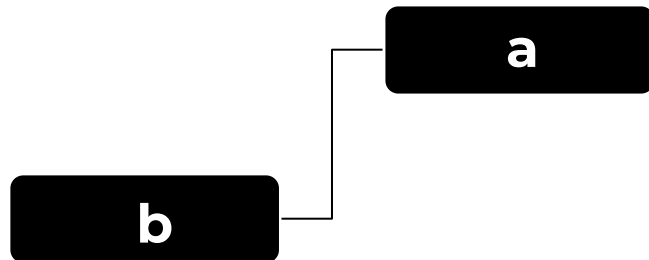Fin Comienzo (FC)**Comienzo Comienzo (CC)****Comienzo Fin (CF)****Fin Fin (FF)****| Dependencias entre tareas**

Proyecto1 - Project Profesional

Inicio ses.

ArchivoTareaRecursoInformeProyectoVistaAyudaDiagrama de GanttFormato¿Qué desea hacer?

Estilos de texto

Cuadrícula

Diseño

Insertar columna

Configuración de columnas

Campos personalizados

Formato

Tareas críticas

Demora

Tareas retrasadas

Ruta de acceso a la tarea

Línea base

Atraso

Estilo de diagrama de Gantt

Número de esquema

Tarea de resumen del proyecto

Tareas de resumen

Dibujo

Dibujos

Diagrama de Gantt

Mostrar u ocultar

DIAGRAMA DE GANTT

	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0		VIVIENDA "ABC"	20 días	lun 10/2/25	vie 7/3/25	
1		ETAPA 01	11 días	lun 10/2/25	lun 24/2/25	
2		Tarea 01	3 días	lun 10/2/25	mié 12/2/25	
3		Tarea 02	4 días	jue 13/2/25	mar 19/2/25	
4		Tarea 03	2 días	mié 19/2/25	jue 21/2/25	
5		Tarea 04	2 días	vie 21/2/25	lun 24/2/25	
6		Reuniones semanales	16 días	vie 14/2/25	vie 7/3/25	
7		Reuniones semanales 1	1 día	vie 14/2/25	vie 14/2/25	
8		Reuniones semanales 2	1 día	vie 21/2/25	vie 21/2/25	
9		Reuniones semanales 3	1 día	vie 28/2/25	vie 28/2/25	
10		Reuniones semanales 4	1 día	vie 7/3/25	vie 7/3/25	
11		ETAPA 02	1 día	mar 25/2/25	mar 25/2/25	
12		Tarea 01	1 día	mar 25/2/25	mar 25/2/25	5

Dependencia entre tareas

De: Tarea 04

Con: Tarea 01

Tipo: Fin a comienzo (FC)

Retardo: 0d

EliminarAceptaCancela

Doble click en la flecha que las vincula para definir la dependencia

OCUPADO

Nuevas tareas : Programada automáticamente

IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

Diagrama de GanttVer

PegarPortapapeles

Calibri11NKS Fuente

0%25%50%75%100%

Actualizar según programaciónRespetar vínculosDesactivarProgramación

Programar manualmenteAutoprogramar

Tareas

Tarea

Insertar

InformaciónPropiedades

Desplazarse a tareaEdición

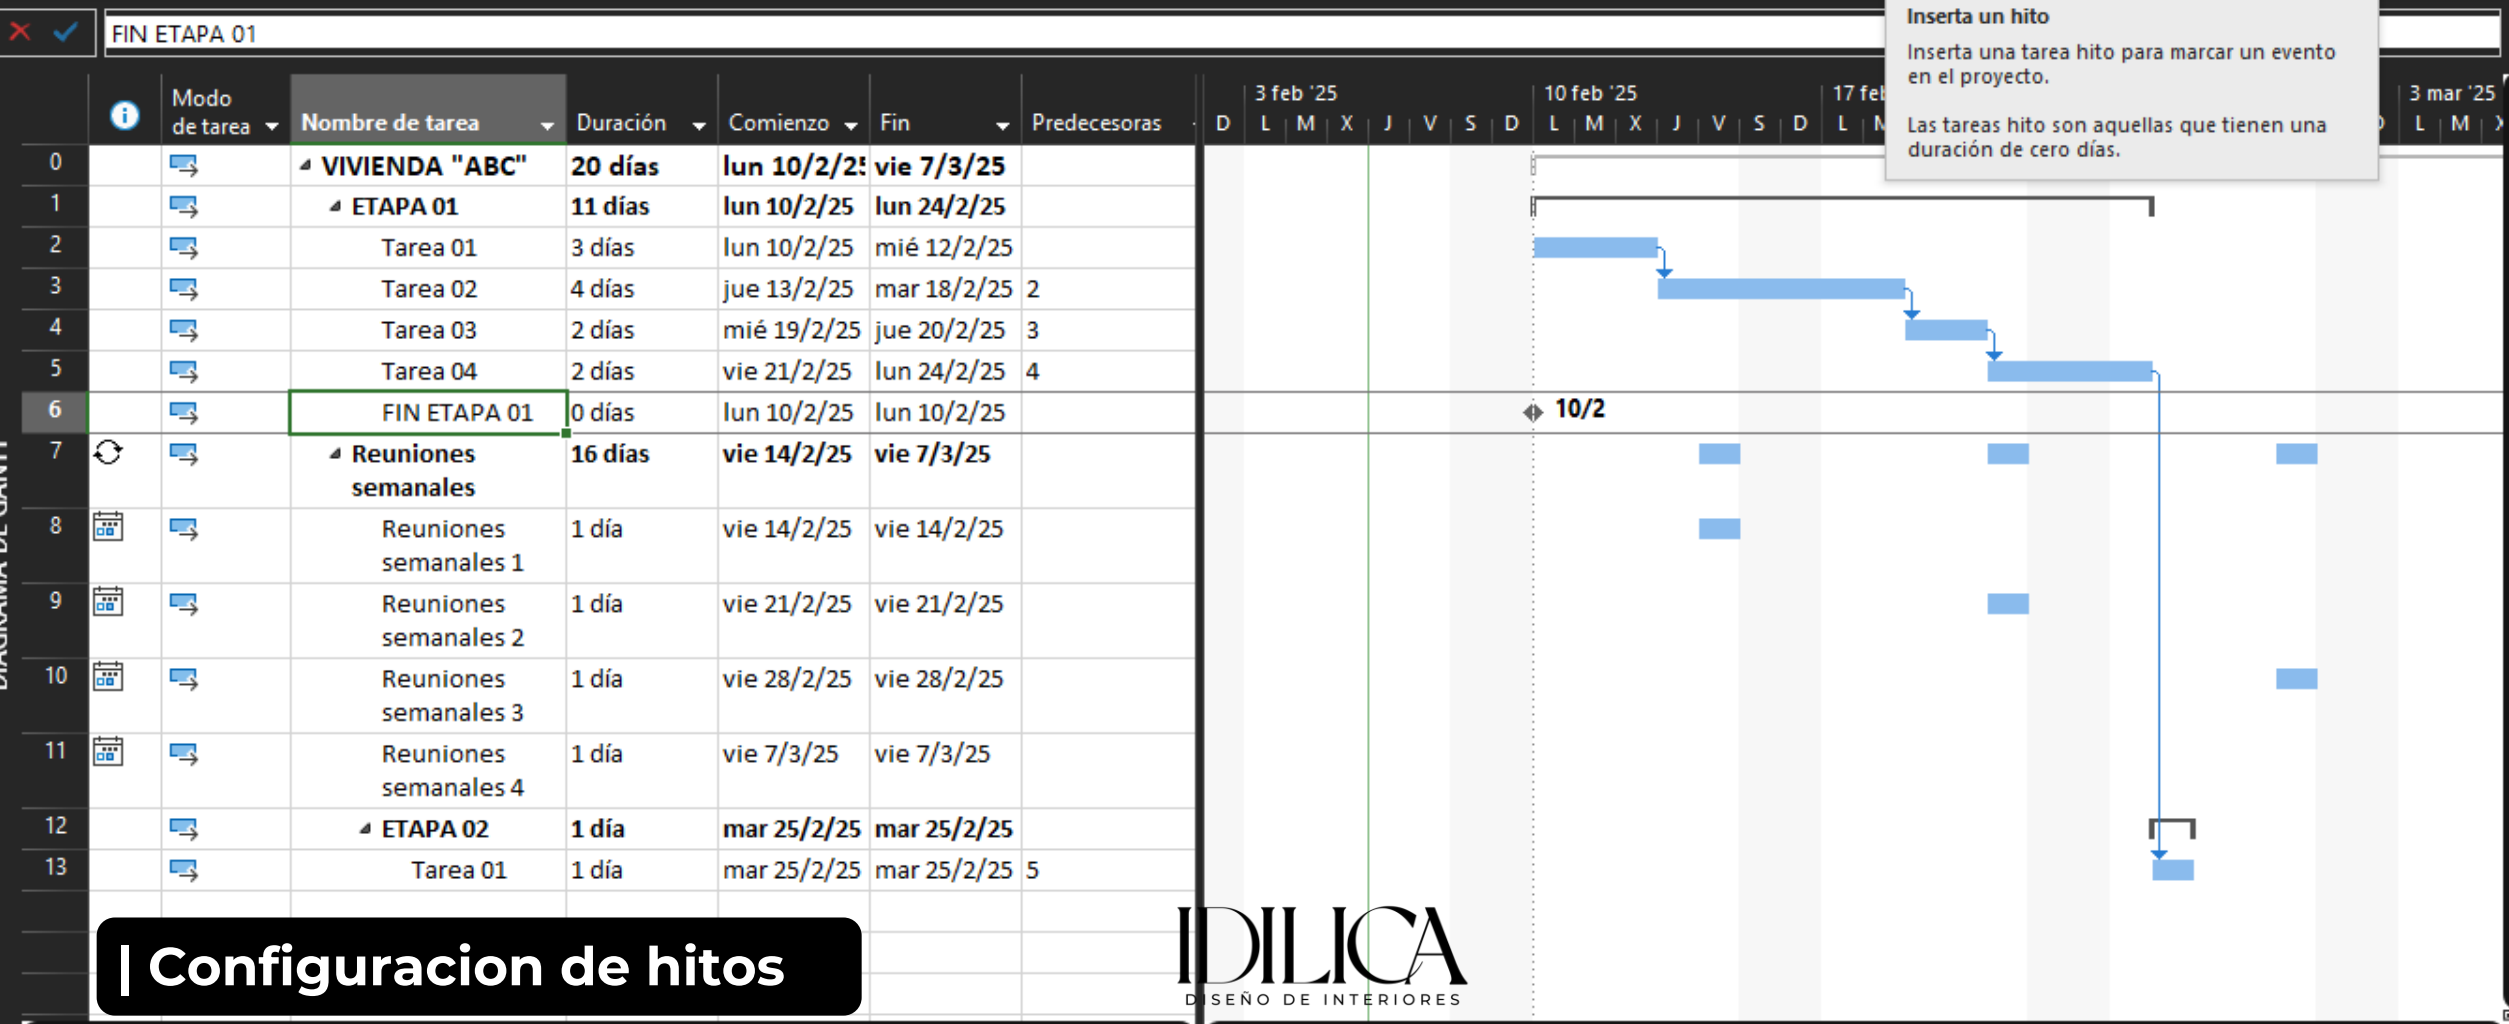


Diagrama de GanttVer

PegarPortapapeles

Calibri11NKS Fuente

0%25%50%75%100%

Actualizar según programaciónRespetar vínculosDesactivarProgramación

Programar manualmenteAutoprogramar


Tareas

Tarea

Insertar

InformaciónPropiedades

Desplazarse a tareaEdición

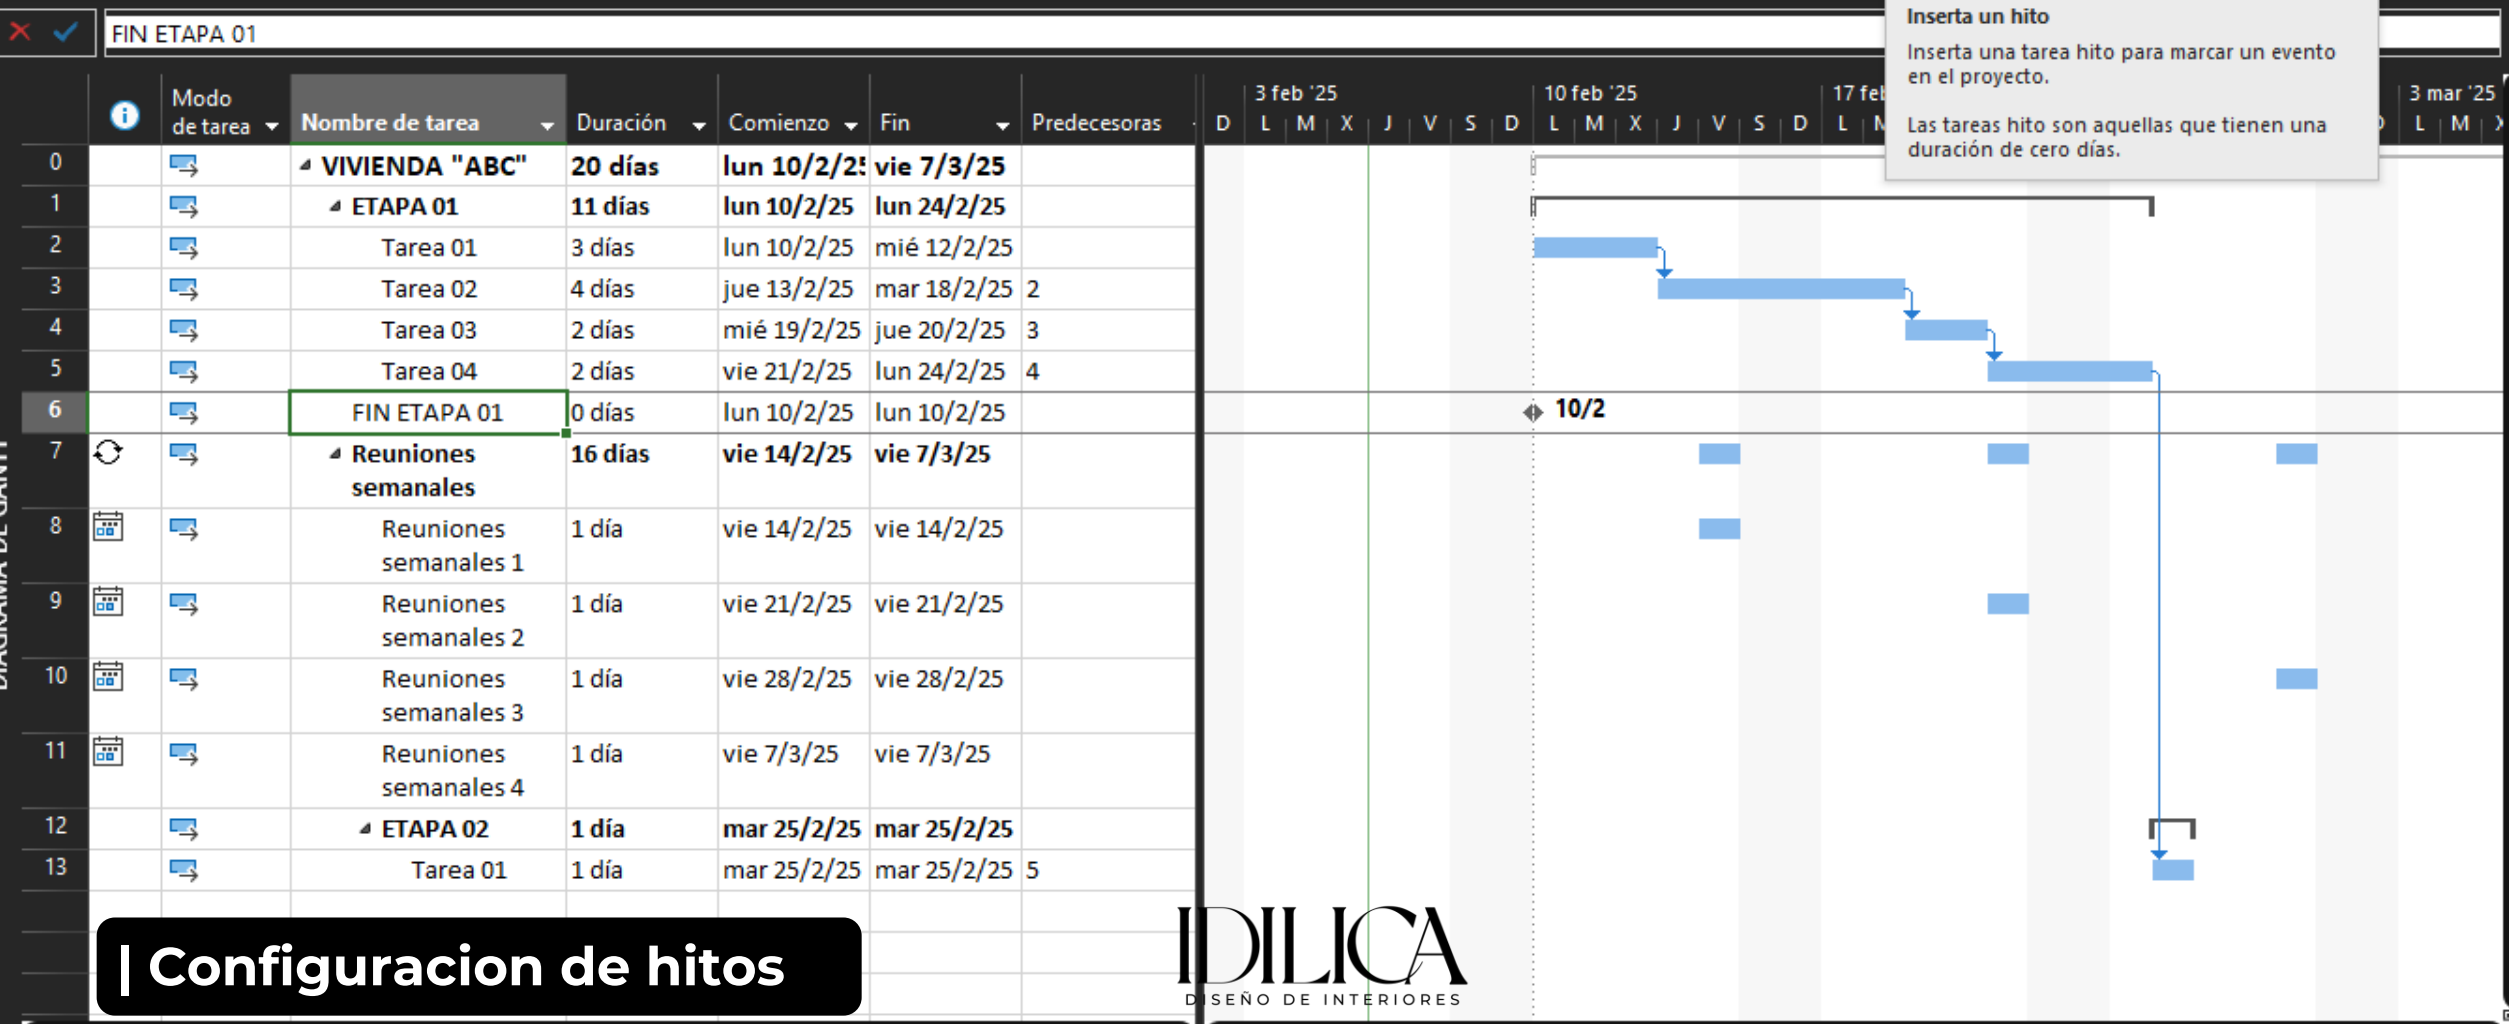


| Configuración de hitos



 Diagrama de Gantt

 Ver

 Pegar

 Portapapeles

Calibri

11

N

K

S



A

Fuente

 0%

 25%

 50%

 75%

 100%

 Actualizar según programación

 Respetar vínculos

 Desactivar

Programación

 Programar manualmente

 Autoprogramar

Tareas

 Tarea


Insertar

 Información

Propiedades


 Desplazarse a tarea

Edición

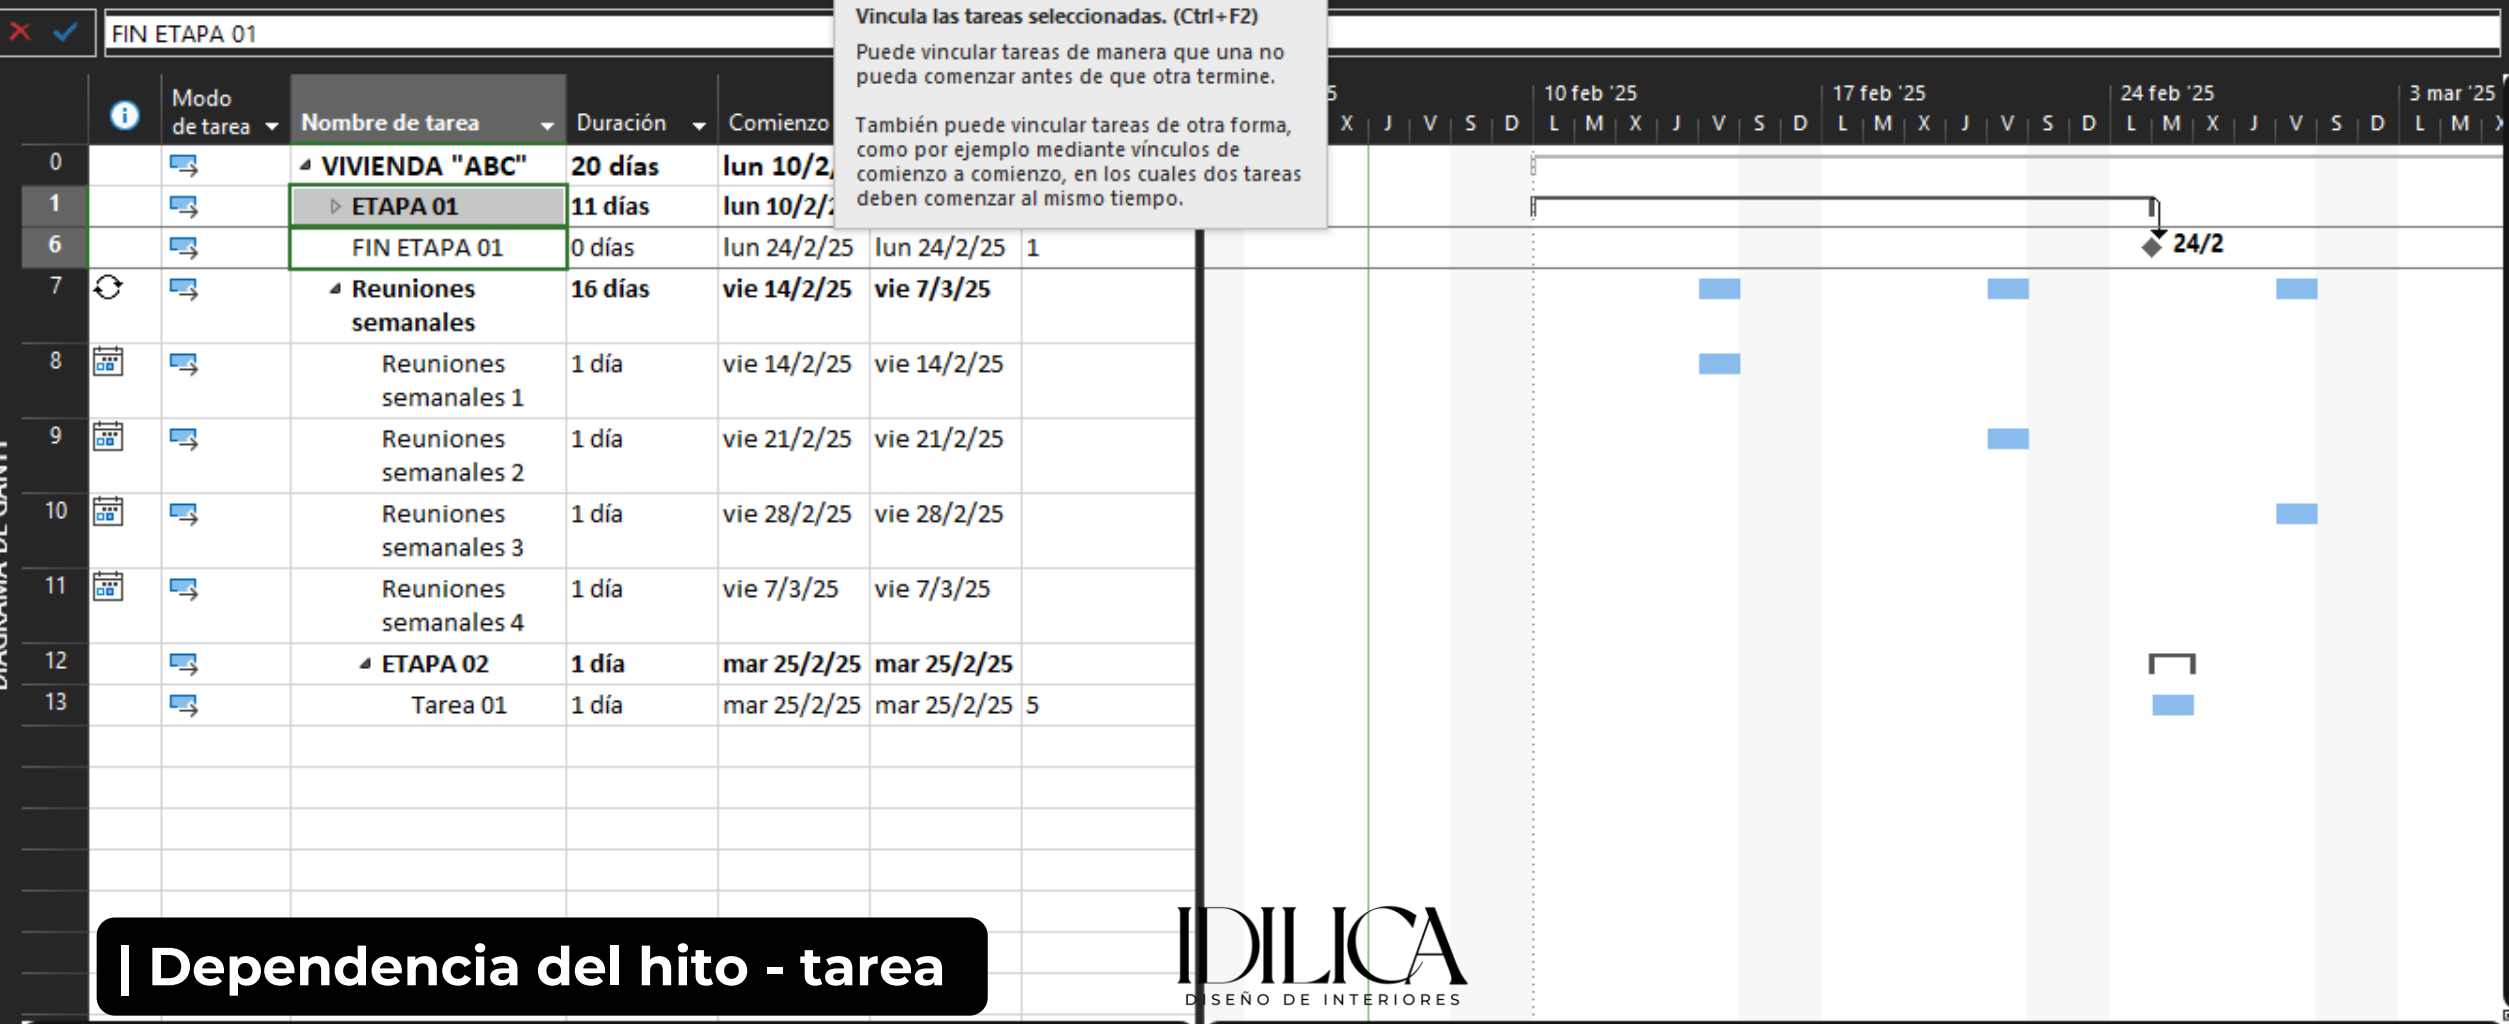

| Dependencia del hito - tarea



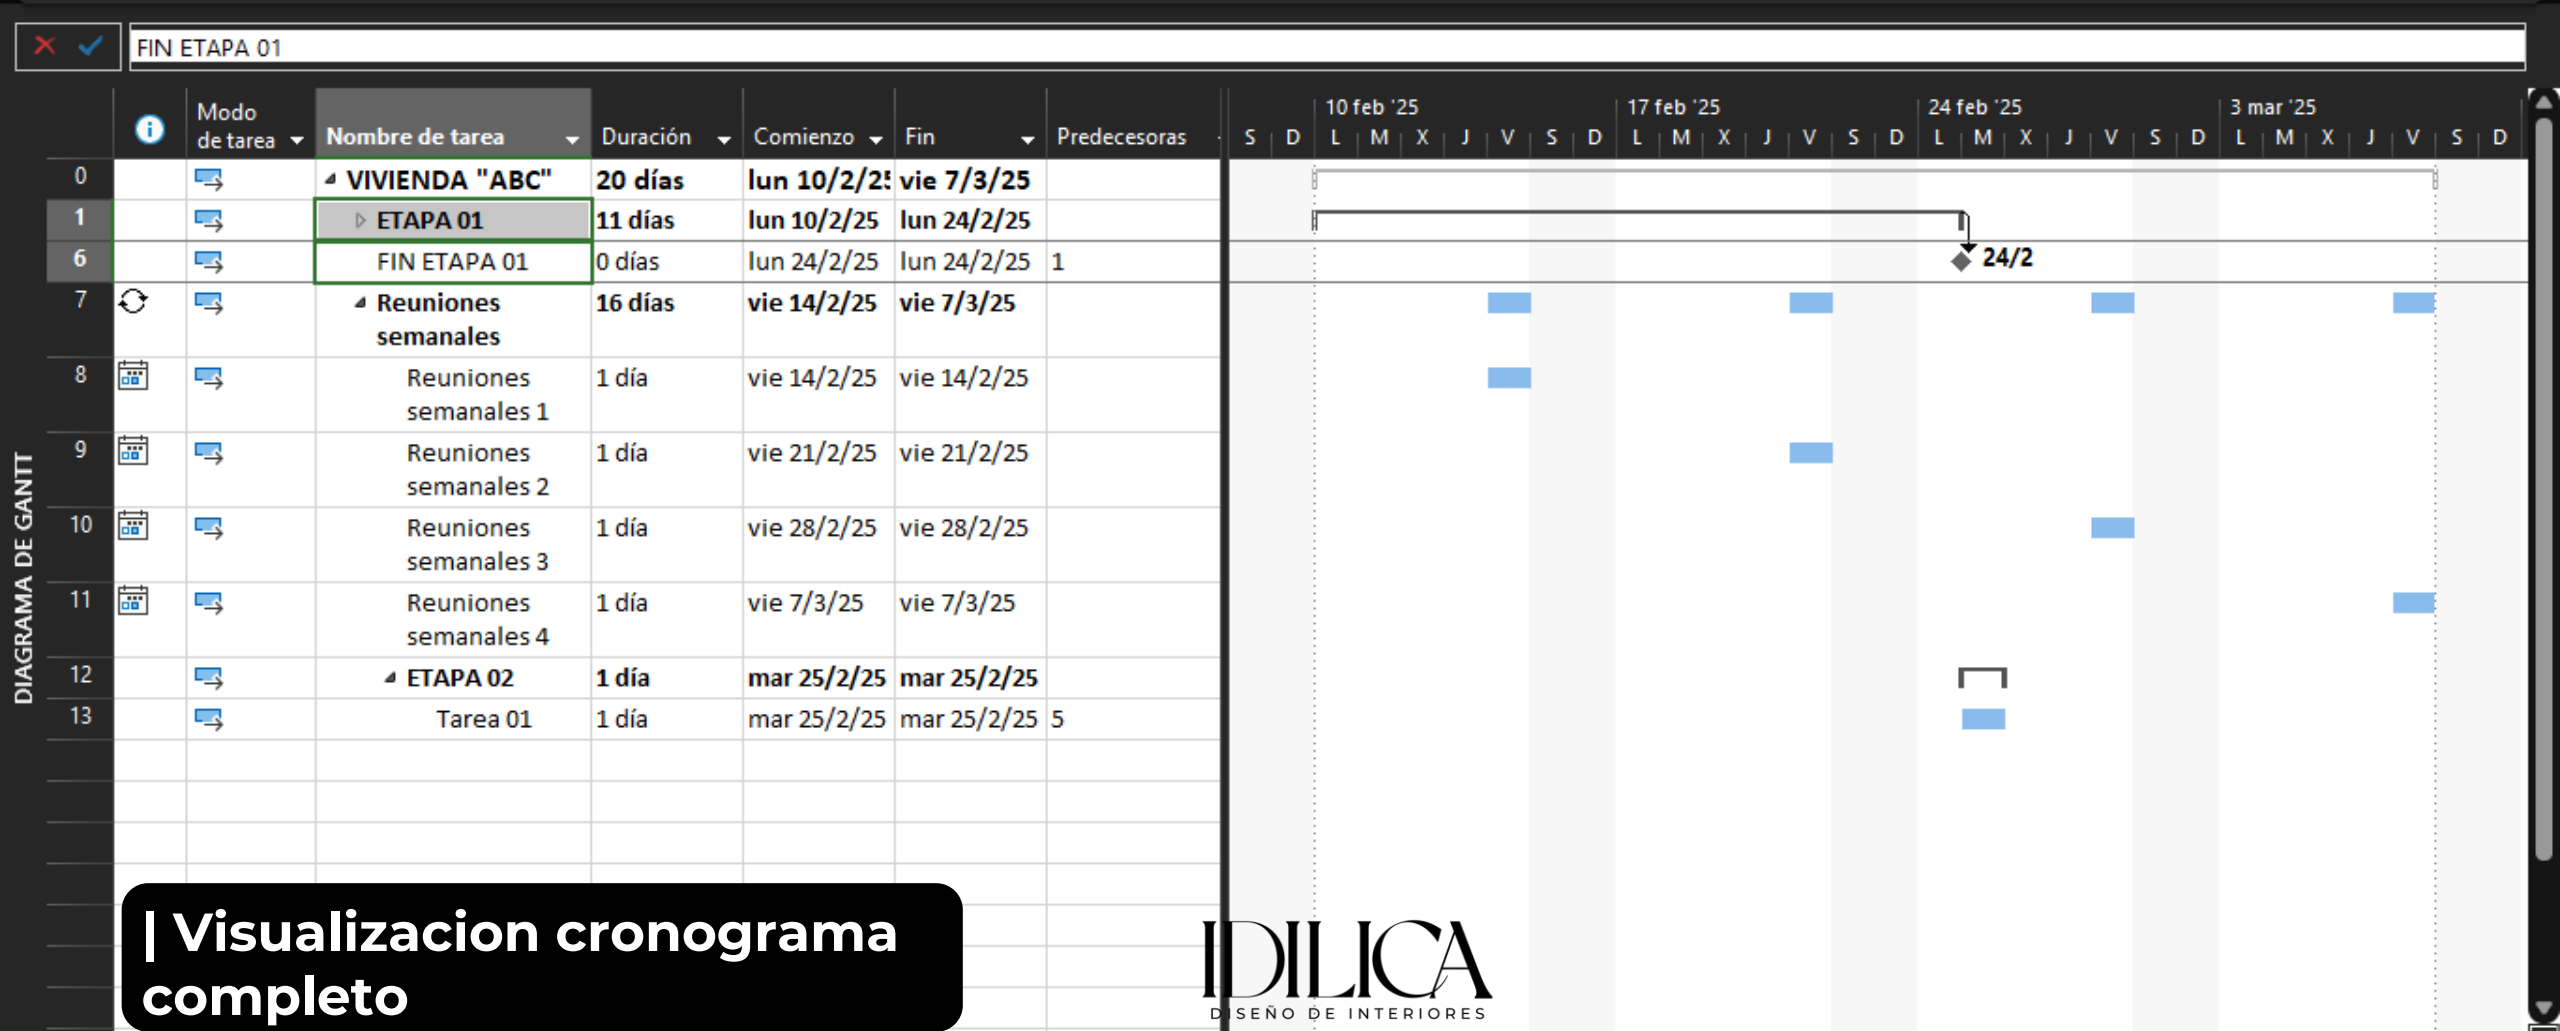



Dibujo

Dibujos



IDILICA
DISEÑO DE INTERIORES

HOJA DE RECURSOS

Diagrama de GanttVer

PegarPortapapeles

Calibri11NKS Fuente

0%25%50%75%100%

Actualizar según programaciónRespetar vínculosDesactivarProgramación

Programar manualmenteAutoprogramar

Tareas

TareaInsertar

Propiedades

Desplazarse a tareaEdición

DIAGRAMA DE GANTT

		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prec	Nombres de los recursos
0			▸ VIVIENDA "ABC"	12 días	lun 10/2/25	mar 25/2/25		
1			▸ ETAPA 01	9 días	lun 10/2/25	jue 20/2/25		
2			Tarea 01	3 días	lun 10/2/25	mié 12/2/25		ARQUITECTA
3			Tarea 02	4 días	jue 13/2/25	mar 18/2/25	2	CONSTRUCTOR
4			Tarea 03	2 días	jue 13/2/25	vie 14/2/25	3CC	ELECTRICISTA
5			Tarea 04	2 días	mié 19/2/25	jue 20/2/25	3	ELECTRICISTA;PINTOR
6			FIN ETAPA 01	0 días	jue 20/2/25	jue 20/2/25	1	
7			▸ Reuniones semanales	8 días	vie 14/2/25	mar 25/2/25		
8			Reuniones semanales 1	1 día	vie 14/2/25	vie 14/2/25		ARQUITECTA; CONSTRUCTOR
9			Reuniones semanales 2	1 día	vie 21/2/25	vie 21/2/25		ARQUITECTA; CONSTRUCTOR
10			▸ ETAPA 02	3 días	vie 21/2/25	mar 25/2/25		
11			Tarea 01	1 día	vie 21/2/25	vie 21/2/25	5	PINTOR
12			Tarea 02	2 días	lun 24/2/25	mar 25/2/25	11	CONSTRUCTOR

10 feb '2517 feb '2524 feb '253 mar '25

ARQUITECTA

CONSTRUCTOR

ELECTRICISTA

ELECTRICISTA;PINTOR

20/2

ARQUITECTA;CONSTRUCTOR

ARQUITECTA;CONSTRUCTOR

PINTOR

CONSTRUCTOR

| Asignacion de recursos

